

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**16.825.757/0001-54 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA OURO BRANCO 495 SALA 01/CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000759/2017	27.11.17	01	31	001	21074490510104	0001		105.459,34

Dados da Liquidação

Número:	26249	Data:	27.11.2017	Valor:	31.241,54
OBRAS E INSTALACOES - CONTRATO ADITIVO					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				31.241,54	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
105.459,34	31.241,54	31.241,54	74.217,80

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.11.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

0,00

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 PIRES - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RUA OURO BRANCO, 495 - Telefone: CEP: 86808-160 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: marcio.piresengcivil@hotmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 16.825.757/0001-54 ***** 17570		Número da NFS-e	
		201700000000051	
		Data do Serviço	Código Verificador
		24/11/2017	ed581da8

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	24/11/2017	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone: Cidade Apucarana UF PR Fone 3420-7000 CEP 86800-235 Bairro SEDE - CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 78.299.815/0001-00 12602 ***** E-mail *****		Apucarana/PR	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail	Fone	
*****	*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DA REFORMA PARA READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.	31.241,54	3,5000	1.093,45	Não

Código do Serviço
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
31.241,54	1.093,45	0,00	0,00	1.093,45	0,00		
Valor Total da NFS-e	31.241,54	Valor Líquido da NFS-e	31.241,54				

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 1.093,45; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 1.093,45. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
---	---

Consulta realizada em 24/11/2017 às 11:44:08.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201700000000051ed581da816825757000154

Recebi(emos) de PIRES - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201700000000051 Número da NFS-e Competência 24/11/2017 NFS-e ed581da8	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 24/11/2017 às 11:44:08.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CMEI ONÉSIMO DE OLIVEIRA MORAES		PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS				
		Reforma	564,50 m²			
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº 612 - JARDIM PRESIDENTE KENNEDY - MUNICÍPIO DE APUCARANA		Ampliação	36,35 m²			
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017						
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
1	REFORMA					
1.1	SERVIÇOS PROVISÓRIOS					
1.1.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. (1,25 X 2)M	M2	2,50	541,37	1.353,43	
1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO (2,9 X 2) (DEPÓSITO E ESCRITÓRIO)	M2	12,30	449,75	5.531,93	
1.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO 1X2M	M2	2,00	296,96	593,92	
	SUBTOTAL - ETAPA	1.1				R\$ 7.479,27
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.2.1	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	12,32	14,86	183,08	
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M3	11,13	37,17	413,70	
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (BEIRAS)	M2	103,42	2,23	230,63	
1.2.4	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRA ESPESSURA 4,0 CM (GRANITINA - SALA DA DIREÇÃO)	M2	16,00	9,71	155,36	
1.2.5	DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO - INCLUINDO EMPILHAÇÃO LATERAL NO CANTEIRO - MURO	M3	0,04	285,03	11,40	
1.2.6	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA - BERCÁRIO	M2	13,76	41,91	576,68	
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE GRANITO	M2	5,94	11,89	70,63	
1.2.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - ANFITEATRO E PLAYGROUND	M3	4,68	217,97	1.020,10	
1.2.9	REMOÇÃO DE ENTULHO DA OBRA COM DESCARTE CONFORME NORMAS	M3	28,00	47,81	1.338,68	
1.2.10	COMPLEMENTAÇÃO, APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ACIMA RELACIONADO	UN	1,00	641,61	641,61	
	* TODOS OS VALORES APRESENTADOS PARA RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA DEVERÃO ATENDER AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ANEXO, COMO TAMBÉM AS NORMAS VIGENTES DO CONAMA E DA LEI MUNICIPAL Nº 46/2014					
	SUBTOTAL - ETAPA	1.2				R\$ 4.641,86
1.3	MOVIMENTO DE TERRAS					
1.3.1	ATERRO INTERNO - COMPACTADO MANUALMENTE	M3	5,64	51,66	291,36	
	SUBTOTAL - ETAPA	1.3				R\$ 291,36
1.4	INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURAS - MURO					
1.4.1	FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS ESCAVADAS					
1.4.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.	M	5,00	43,41	217,05	
1.4.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 4Ø -8,0 MM.	KG	8,00	8,48	67,84	
1.4.2	VIGAS BALDRAMES (12x25)					
1.4.2.1	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2X	M2	0,16	50,85	8,14	
1.4.2.2	LASTRO DE BRITA	M3	0,02	75,27	1,51	
1.4.2.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,02	281,97	5,64	
1.4.2.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	0,02	98,79	1,98	
1.4.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS (BALDRAME E LATERAIS), COM TINTA ASFÁLTICA (EMULSÃO), COBRIMENTO - DUAS DEMÃOS	M2	0,52	8,52	4,43	
1.4.3	ESTRUTURA					
1.4.3.1	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO 2X	M2	4,00	50,85	203,40	
1.4.3.2	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	6,40	8,32	53,25	
1.4.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	1,54	8,32	12,81	
1.4.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,15	8,32	1,25	
1.4.3.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	0,15	8,32	1,25	
	SUBTOTAL - ETAPA	1.4				R\$ 578,53
1.5	PAREDES E PAINÉIS					
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19x19 cm (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² - FECHAR VÃO NA DIRETORIA, BANCADA DO BERCÁRIO E LAVATÓRIOS	M2	12,45	49,53	616,65	
	SUBTOTAL - ETAPA	1.5				R\$ 616,65
1.6	COBERTURA					
1.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	50,00	21,99	1.099,50	
	SUBTOTAL - ETAPA	1.6				R\$ 1.099,50
1.7	ESQUADRIAS METÁLICAS					
1.7.1	JANELAS METÁLICAS					
1.7.1.1	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	1,00	826,80	826,80	
1.7.1.2	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	M2	2,16	857,95	1.853,17	
1.7.2	PORTAS METÁLICAS					
1.7.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTA PARA OS BANHEIROS (VASOS)	M2	4,62	614,69	2.839,87	
	SUBTOTAL - ETAPA	1.7				R\$ 5.519,84
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
	Obs.: Está incluso nos itens abaixo relacionados todos os materiais necessários e acessórios gerais (parafusos, buchas e outros)/ mão de obra de instalação, montagem, abertura e fechamentos de rasgos em paredes/ abertura e fechamento de vala.					
1.8.1	INSTALAÇÕES					
1.8.1.1	INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO INTERLIGAÇÕES DE CAIXAS/ PASSAGENS/ CAIXAS SÉPTICA (****)	M2	50,00	6,41	320,50	
1.8.2	HIGIENIZAÇÃO/ BERCÁRIO					
1.8.2.1	SÓCULO EM ALVENARIA REVESTIDA E BASE EM CIMENTO ALISADO, ESPESSURA 10CM - LARGURA 0,55M - CONFORME DETALHE	M	11,55	22,01	254,22	
1.8.2.2	TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CONFORME DETALHE, ESPESSURA 3CM, INCLUINDO RODAPIA E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M2	3,87	365,45	1.414,29	
1.8.2.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50CM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	94,62	94,62	
1.8.2.4	CUBA DE FIBRA - 23X55X80CM / INCL. VÁLVULA DE FUNDO/ SIFÃO PVC	UN	2,00	346,67	693,34	
1.8.2.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	56,78	113,56	
1.8.2.6	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	17,89	25,14	449,75	
1.8.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES COM REJUNTAMENTO	M2	17,89	37,41	669,26	
1.8.3	SANITÁRIOS - ALUNOS					
1.8.3.1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50CM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	95,07	855,63	
1.8.3.2	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	30,09	270,81	
1.8.3.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	82,86	745,74	
1.8.3.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO CROMADO COM TEMPORIZADOR	UN	9,00	103,42	930,78	
1.8.3.5	TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CONFORME DETALHE, ESPESSURA 3CM, INCLUINDO RODAPIA E SUPORTE DE FIXAÇÃO - CONF DETALHES	M2	4,05	365,45	1.480,07	
1.8.3.6	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO	M2	1,80	371,95	669,51	
	SUBTOTAL - ETAPA	1.8				R\$ 8.962,09
1.9	REVESTIMENTOS DE FORROS/ PAREDES					
1.9.1	FORRO DE BEIRAL					
1.9.1.1	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, INCOMBUSTÍVEL: ATENDENDO A NBR 9442 - NBR 14.371, NPT 010 (COM COLOCACAO/COM ENTARUGAMENTO METÁLICA)	M2	103,42	45,54	4.709,75	
1.9.1.2	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	128,35	2,80	359,38	
1.9.2	REVESTIMENTOS INTERNOS					
1.9.2.1	PISO GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIDO	M2	16,00	94,94	1.519,04	
1.9.2.2	RODAPÉ EM GRANILITE E OUTROS	M	16,20	22,44	363,53	
	SUBTOTAL - ETAPA	1.9				R\$ 6.951,69
1.10	PINTURAS					
	Obs.:As cores são definidas no projeto arquitetônico e especificações.					
1.10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS - FOSCO	M2	617,89	11,17	6.901,83	
1.10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - SEMI BRILHO EM PAREDES INTERNAS	M2	1029,62	9,98	10.275,61	
1.10.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. APENAS PARA CORREÇÕES ONDE NECESSÁRIO	M2	250,00	7,95	1.987,50	
1.10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - MUROS FACHADA E LATERAL (INTERNO E EXTERNO)	M2	356,00	9,79	3.485,24	
	SUBTOTAL - ETAPA	1.10				R\$ 22.650,18
1.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
1.11.1	ELEMENTOS DE GRANITO					
1.11.1.1	ELEMENTO EM GRANITO PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO (1,50X0,90X0,02)	UN	1,00	441,04	441,04	
1.11.2	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO NA REFORMA					
1.11.2.1	MURO - ALTURA 2,00M, COM ALVENARIA SOBRE ARRIMO E DETALHES DE CONCRETO CHAPISCADO, REBOCADO E PINTADO DOS DOIS LADOS CONFORME DETALHE FRENTE	M2	17,34	284,41	4.931,67	
1.11.2.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA INCLUINDO PREPARO DO TERRENO E ADUBAÇÃO - PLAYGROUND E ANFITEATRO ATERRADO	M2	74,00	7,14	528,66	
1.11.3	SERVIÇOS DE LIMPEZA					
1.11.3.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	35,00	2,22	77,56	
1.11.3.2	LIMPEZA PISO GRANILITE	M2	16,00	12,33	197,22	
1.11.4	VIDROS					
1.11.4.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - JANELA DA DIREÇÃO	M2	2,16	115,36	249,18	
	SUBTOTAL - ETAPA	1.11				R\$ 6.425,32
			TOTAL GERAL - REFORMA - 01			R\$ 65.216,30

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CMEI ONÉSIMO DE OLIVEIRA MORAES		PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS				
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº 612 - JARDIM PRESIDENTE KENNEDY - MUNICÍPIO DE APUCARANA		Reforma	564,50	m²		
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017		Ampliação	36,35	m²		
2.	AMPLIAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
2.1	COBERTURA					
2.1.1	COBERTURA EM POLICARBONATO NA COR AZUL, INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA E PILARETES METÁLICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME DETALHES	M2	36,35	348,52	12.668,70	
	SUBTOTAL - ETAPA 2.1					R\$ 12.668,70
2.2	PÓRTICO DE ENTRADA					
2.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL E MATERIAL INSERVÍVEL, ESPESSURA 0,20M, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	8,00	0,47	3,73	
2.2.2	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMAÇÃO.	M	12,00	43,41	520,97	
2.2.3	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, # 8,0 MM.	KG	50,00	8,49	424,45	
2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,8MM - MONTAGEM.	KG	240,00	8,49	2.037,36	
2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	160,00	9,84	1.573,86	
2.2.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - SEM LANÇAMENTO	M3	2,00	281,97	563,95	
2.2.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	2,00	98,79	197,58	
2.2.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	11,00	39,77	437,48	
2.2.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	M2	22,00	6,23	137,04	
2.2.10	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	22,00	25,12	552,57	
2.2.11	CERÂMICA 10X10 CM - O MATERIAL DEVERÁ PASSAR POR PRÉ-APROVAÇÃO DA ENGENHARIA	M2	36,00	89,36	3.216,96	
2.2.12	SERVIÇOS DE REJUNTAMENTO DA CERÂMICA COM REJUNTE FLEXÍVEL RESINADO OU ACRÍLICO	M2	36,00	1,83	66,01	
2.2.13	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA (PASTILHAS)	M2	36,00	6,72	241,88	
2.2.14	PORTÃO DE ENTRADA EM PERFIL METÁLICO CONFORME DETALHE	M2	4,00	197,34	789,36	
2.2.15	FECHADURA COM TRAVA ELÉTRICA/ INTERFONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	606,18	606,18	
2.2.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2,00	9,80	19,59	
2.2.17	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	4,00	22,30	89,22	
2.2.18	VIDRO TEMPERADO 8MM 60X70 ADESIVADO NO VERSO (45X60) FIXADO COM BOTON - CONFORME PROJETO	M2	0,42	316,42	132,90	
2.2.19	REFLETOR LED 10W - BIVOLT BRANCO FRIO -	UN	1,00	45,54	45,54	
	SUBTOTAL - ETAPA 2.2					R\$ 11.656,62
TOTAL GERAL - AMPLIAÇÃO - 02						R\$ 24.325,32

RESUMO GERAL / REFORMA			
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%
1.1	SERVIÇOS PROVISÓRIOS	R\$ 7.479,27	11,47
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.641,86	7,12
1.3	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 291,36	0,45
1.4	INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURAS - MURO	R\$ 578,53	0,89
1.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 616,65	0,95
1.6	COBERTURA	R\$ 1.099,50	1,69
1.7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 5.519,84	8,46
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.962,09	13,74
1.9	REVESTIMENTOS DE FORROS/ PAREDES	R\$ 6.951,69	10,66
1.10	PINTURAS	R\$ 22.650,18	34,73
1.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.425,32	9,85
TOTAL GERAL - REFORMA - 01		R\$ 65.216,30	100,00

RESUMO GERAL / AMPLIAÇÃO			
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%
2.1	COBERTURA	R\$ 12.668,70	52,08
2.2	PÓRTICO DE ENTRADA	R\$ 11.656,62	47,92
TOTAL GERAL - AMPLIAÇÃO - 02		R\$ 24.325,32	100,00


RESUMO GERAL	
TOTAL SERVIÇOS DE REFORMA	R\$ 65.216,30
TOTAL SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO	R\$ 24.325,32
TOTAL GERAL	R\$ 89.541,62

Obs.: Preços referente a partir de Novembro/2017 - Tabela Sinapi, Paraná Edificações e Orçamentos

Apucarana, 24 de novembro de 2017.

Marcio Pires

MARCIO PIRES
Sócio
CPF 009.146.569-96
CREA-PR 148359/D



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 757712530001/68

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 25709/2017

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, em atendimento ao requerimento protocolado em 16/11/2017, sob n.: 46230, em nome de:

Nome.....: PIRES - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ.....: 16.825.757/0001-54

Endereço.....: RUA OURO BRANCO

495

Bairro.....: SEDE - CENTRO

Cidade.....: APUCARANA

UF: PR

Informado pela seção de Cadastro IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO, que:

"Possui até a presente data débitos à vencer com a Fazenda Municipal, era o que tínhamos a certificar, face ao requerido."

Finalidade.....: PARA OS DEVIDOS FINS

Validade.....: 60 (sessenta) DIAS.

OBSERVAÇÕES:

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL

Edifício da Prefeitura Municipal de Apucarana

em 16/11/2017

SUELI APARECIDA de FREITAS PEREIRA
Superintendente da Tributação

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 017111592-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **16.825.757/0001-54**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/02/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PIRES - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 16.825.757/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:49:00 do dia 30/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2017.

Código de controle da certidão: **AB06.9979.D1F1.3BE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PAVAN & BARROS
engenharia

RELATÓRIO PARA ADITIVO

Obra: Reforma Câmara Municipal de Apucarana

Readequação nos Banheiros para Pessoas Especiais, Cobertura Metálica, Pisos e Azulejos

Local: Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, S/Nº - Apucarana – PR

Da Adição e Supressão:


É necessário e de suma importância para o bom andamento da obra a inclusão dos seguintes itens em forma de aditivo ao contrato ora firmado:

1. Serviços Preliminares:

1.1. Contratação de caçambas, transporte e destinação de entulhos não utilizáveis em obra (composição representativa). *(Ordem 27 da Planilha de Aditivo)*

1.2. Retirada e transporte de entulhos não utilizáveis até a caçamba, feito manualmente pelos operários da empreiteira contratada, utilizando carrinho de mão. *(Ordem 28 da Planilha de Aditivo)*

1.3. Atendendo à solicitação da Comissão de Licitação da Câmara, foram instaladas chapas em madeira compensada para fechamento dos vãos, sendo sua colocação e retirada feita diariamente pela empreiteira. Proporcionando segurança no período sem expediente. *(Ordem 21 da Planilha de Aditivo)*






PAVAN & BARROS
engenharia



Caçamba para remoção de
resíduos

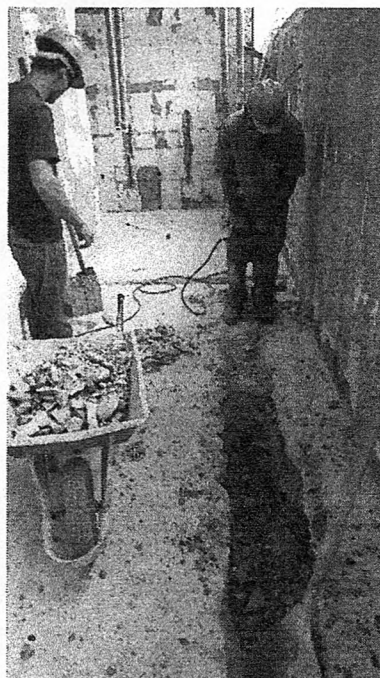

Retirada e transporte de
entulho



Tapumes para fechamento de
vãos

2. Cobertura:

2.1. Remoção do revestimento de argamassa da face interna da platibanda, sendo que o mesmo se encontrava em estado de deterioração. (*Ordem 20 da Planilha de Aditivo*)

2.2. Chapisco e emboço na face interna da platibanda e requadro na face superior para recebimento do rufo em chapa galvanizada. (*Ordem 02 da Planilha de Aditivo*)
