



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

055.385.279-56 SAULO EMANUEL DE BARROS
RUA JOAQUIM DIOGO PACHECO S/N JD POR

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000797/2017	12.12.17	01	31	001	2001	3390360600	0001	6.900,00

Dados da Liquidação

Número:	27625	Data:	12.12.2017	Valor:	6.180,27
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PF - PRIMEIRO ADITIVO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					6.180,27

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.900,00	6.180,27	6.180,27	719,73

Programação Financeira

Data do Vencimento: 12.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE


Emitente


RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SAULO EMANUEL DE BARROS RUA SAO PAULO, 343 - Telefone: CEP: 68000-000 - Bairro: VL FELIZ Município: Apucarana - PR E-mail: saulobarros.eng@gmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 055.385.279-56 ***** 24546		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000004</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">12/12/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">3dbeaae3</h2>
---	--	---	--	---

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	12/12/2017	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ESTA NOTA REFERE-SE 89,57% DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2017 (PRIMEIRO ADITIVO), CONFORME RELATORIO E MEMORIAL DESCRITIVO.	6.180,27	2,5000	0,00	Não

Código do Serviço
07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOf *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 6.180,27	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e	6.180,27	Valor Líquido da NFS-e	6.180,27				

Informações Adicionais

Reg. Especial: Estimativa.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.



Consulta realizada em 12/12/2017 às 15:00:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201700000000043dbeaae305538527956

Recebi(emos) de SAULO EMANUEL DE BARROS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201700000000004 Número da NFS-e Competência 12/12/2017 NFS-e 3dbeaae3	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 12/12/2017 às 15:00:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



PAVAN & BARROS
engenharia

Recebido em:

___/___/___

MEMORIAL DESCRITIVO DE ACRESCIMO DE HORAS TRABALHADAS

Obra: Reforma Câmara Municipal de Apucarana

Readequação nos Banheiros para Pessoas Especiais, Cobertura Metálica, Pisos e Azulejos

Local: Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, S/Nº - Apucarana – PR

Este memorial tem como objetivo relatar os serviços, horas, valores e percentual executados referente a solicitação de aditivo entregue no dia 20/11/2017, conforme descrito abaixo:


SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL GLOBAL	ADITIVADO
Acompanhamento e Aferição (Acréscimo de Serviço)	HORA	60	R\$ 115,00	R\$ 6.900,00	41,67%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO	EQUIVALENTE DO % ADITIVADO	VALOR A RECEBER
Medições "in loco" para levantamento de quantitativo	100%	9,07%	R\$ 1.501,99
Levantamento quantitativo de serviço	100%	9,07%	R\$ 1.501,99
Levantamento de valores junto à empreiteira	100%	9,07%	R\$ 1.501,99
Elaboração de relatório de Aditivo	100%	9,07%	R\$ 1.501,99
Acompanhamento e aferição	19,34%	5,38%	R\$ 172,31
TOTAL			R\$ 6.180,27

Apucarana - PR, 20 de novembro de 2017


Saulo Barros

CREA-PR: 150.977/D



PAVAN & BARROS
engenharia

RELATÓRIO
ACOMPANHAMENTO DE OBRA
MEDIÇÃO ADITIVO

Obra: Reforma Câmara Municipal de Apucarana

Readequação nos Banheiros para Pessoas Especiais, Cobertura Metálica, Pisos e Azulejos

Local: Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, S/Nº - Apucarana – PR

Do Acompanhamento

1. Serviços Preliminares:


- 1.1. Contratação de caçambas, transporte e destinação de entulhos não utilizáveis em obra (composição representativa).
- 1.2. Retirada e transporte de entulhos não utilizáveis até a caçamba, feito manualmente pelos operários da empreiteira contratada, utilizando carrinho de mão.
- 1.3. Foram instaladas chapas em madeira compensada para fechamento dos vãos, sendo sua colocação e retirada feita diariamente pela empreiteira.




PAVAN & BARROS
engenharia



Caçamba para remoção de
resíduos

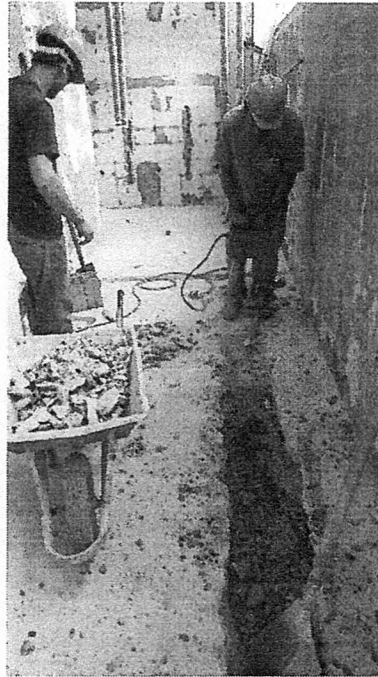

Retirada e transporte de
entulho

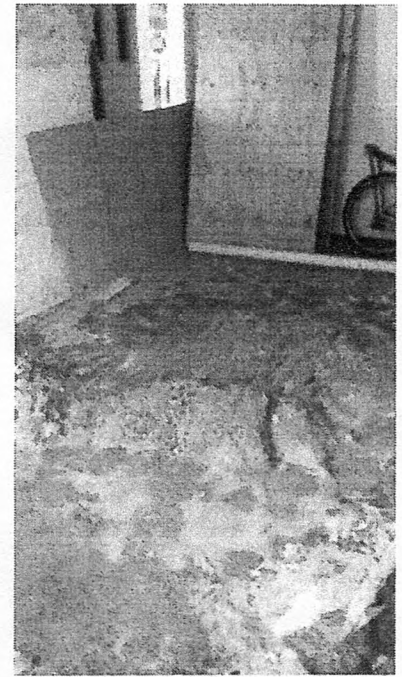

Tapumes para fechamento de
vãos

2. Cobertura:

2.1. Remoção do revestimento de argamassa da face interna da platibanda, sendo que o mesmo se encontrava em estado de deterioração.

2.2. Chapisco e emboço na face interna da platibanda e requadro na face superior para recebimento do rufo em chapa galvanizada.


Obs.: O item 2.2 da planilha orçamentária (revisão nas emendas das calhas existente...) terá o seu valor suprimido, pois as calhas serão devidamente substituídas conforme item 2.3 conforme relatório para aditivo de 20/11/2017.




PAVAN & BARROS
engenharia



Remoção do revestimento da
platibanda

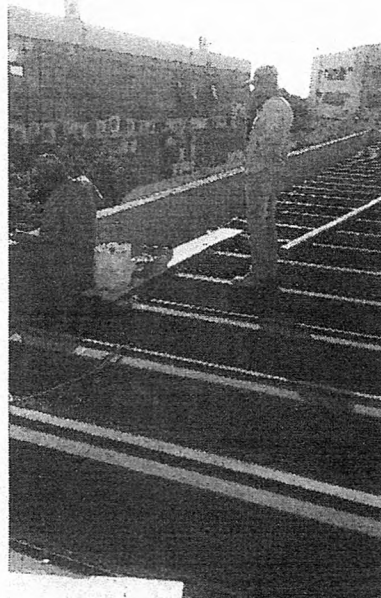

Execução do novo
revestimento da platibanda

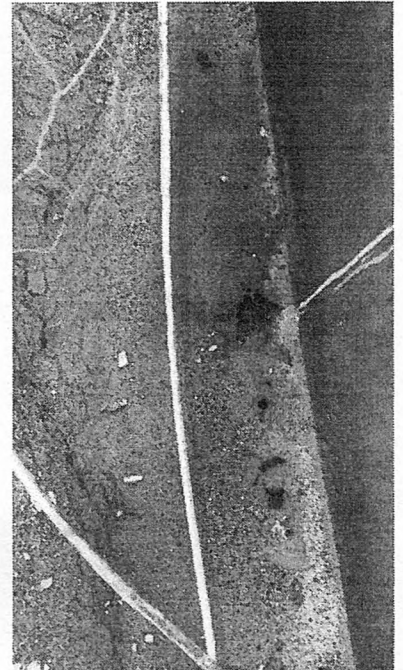

Estado de deterioração da
calha


3. Esquadrias de Madeira / Alumínio e Vidros:

- 3.1. Realização de chapisco e emboço utilizados para requadros e revestimentos das paredes de suporte do aparelho de ar condicionado.
- 3.2. Foi realizada retirada e instalação de novos batentes e acessórios nos banheiros masculino, feminino.

Obs.: O item 3.2 da planilha orçamentária (porta de madeira para verniz...) terá o seu valor suprimido, pois seu item será substituído pelo item 3.4 descrito relatório para aditivo de 20/11/2017.



PAVAN & BARROS
engenharia

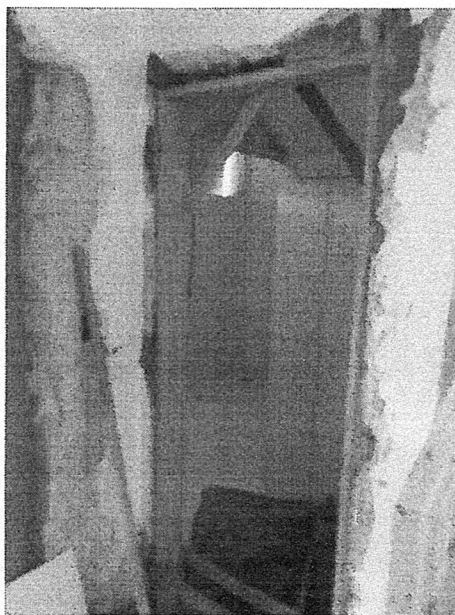

Retirada e instalação de novos batentes

4. Instalações Hidrossanitárias:

- 4.1. Foi executado a alvenaria de vedação de blocos cerâmicos utilizado pa edificação das paredes de suporte do aparelho de ar condicionado e balcão da cozinha;
- 4.2. Foi necessário a escavação manual de valas para a instalação da tubulação da nova rede de esgoto, executada nos banheiros masculino, feminino e especial;
- 4.3. Para o fechamento das referidas valas usou-se concreto com preparo mecânico que também foi aplicado no piso elevado da plenária;
- 4.4. Foi Instaladas as bancadas de apoio de granito cinza polido com medidas 1,72x0,35m e 1,51x0,40m, instaladas na cozinha.





PAVAN & BARROS
engenharia



Escavação manual de valas



Fechamento de valas

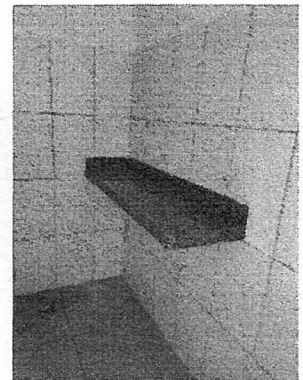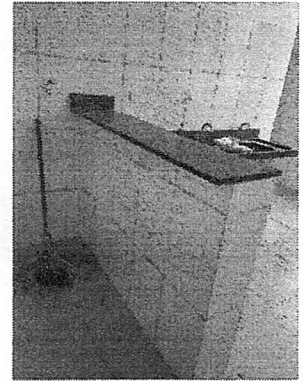


Bancadas de Apoio

5. Revestimento de Parede:

5.1. Foi realizado chapisco e emboço utilizados para revestir balcão da cozinha;

5.2. Retirou-se o forro de PVC, e foi realizada a colocação da manta térmica e novo forro de mesmo material, elevando à altura do pé direito, nos ambientes: Depósito, Estúdio/CPD/Circulação e Arquivo morto;

5.3. Foi necessário também a retirada do forro em PVC da sala do protocolo, pois sua estrutura de suporte estava comprometida;




PAVAN & BARROS
engenharia


5.4. Executou-se a demolição dos forros de gesso nos banheiros e gabinete presidencial, para a instalação de um novo forro.



Retirada e elevação da Estrutura do forro de PVC

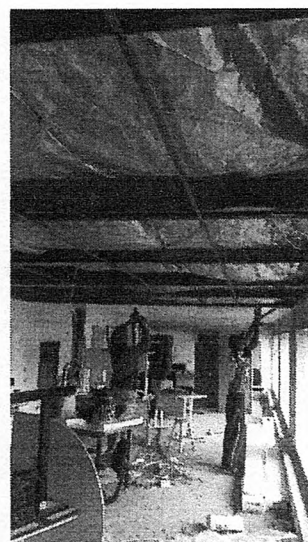

Instalação da Manta Térmica

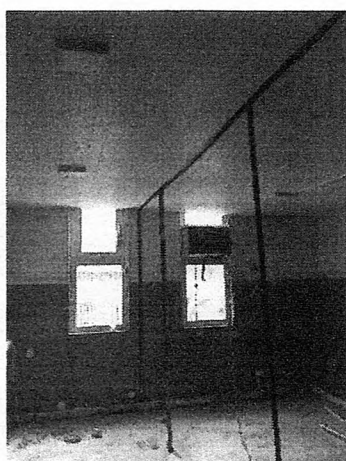

Forro de PVC da sala de protocolo apoiado pela estrutura da divisória



Instalação do forro de gesso
