



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

055.385.279-56 SAULO EMANUEL DE BARROS
RUA JOAQUIM DIOGO PACHECO S/N JD POR

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000591/2017	29.08.17	01	31	001	2001	3390360600	0001	16.560,00

Dados da Liquidação

Número: 24879	Data: 29.08.2017	Valor: 5.519,45
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PF - ENGENHEIRO MEDICAO		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		5.519,45

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
16.560,00	8.556,55	5.519,45	8.003,45

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.11.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE


Emitente


RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SAULO EMANUEL DE BARROS RUA SAO PAULO, 343 - Telefone: CEP: 68000-000 - Bairro: VL FELIZ Município: Apucarana - PR E-mail: saulobarros.eng@gmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 055.385.279-56 ***** 24546		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000003</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07/11/2017</td> <td style="text-align: center;">4876d88c</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	07/11/2017	4876d88c
Data do Serviço	Código Verificador					
07/11/2017	4876d88c					

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	07/11/2017	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone 3420-7000	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****
E-mail *****		Fone *****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ESTA NOTA REFERE-SE A 33,33% DOS SAERVIÇOS REALIZADOS DE 05/10/2017 À 04/11/2017 CONFORME RELATÓRIO MENSAL (OUTUBRO/2017). PROCESSO LICITATÓRIO - CARTA CONVITE 05/2017 - CONTRATO Nº 09/2017	5.519,45	2,5000	0,00	Não

Código do Serviço
07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	I OF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 5.519,45	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		5.519,45		Valor Líquido da NFS-e		5.519,45	

Informações Adicionais

Reg. Especial: Estimativa.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.




Consulta realizada em 07/11/2017 às 09:14:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de SAULO EMANUEL DE BARROS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201700000000003 Número da NFS-e Competência 07/11/2017 NFS-e 4876d88c	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 07/11/2017 às 09:14:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



PAVAN & BARROS
engenharia

RELATORIO MENSAL ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Obra: Reforma Câmara Municipal de Apucarana
Readequação nos Banheiros para Pessoas Especiais, Cobertura Metálica, Pisos e Azulejos

Local: Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, S/Nº - Apucarana – PR

Mês e Ano de Referência: Outubro/2017

Do Acompanhamento:


- **Serviços Preliminares:**

Dos serviços preliminares permanece a locação mensal de andaimes metálicos. Sendo necessário também a contratação de caçamba, transporte e destinação dos resíduos da obra.

O item sublinhado não está contido na planilha orçamentária.

- **Cobertura:**

Foi executado em sua totalidade a instalação do rufo em chapa metálica de aço galvanizado com corte de 0,72m, cobrindo a face interna da platibanda; e, parte da instalação do rufo em chapa de aço galvanizado com corte de 1,10m



PAVAN & BARROS
engenharia

- **Esquadrias de Madeira / Alumínio e Vidros:**

Foram retiradas as esquadrias metálicas e efetuando o requadro dos vãos no Hall de entrada, Sala do Protocolo e Gabinete Presidencial.

Fornecimento e Instalação dos vidros temperados, incolor, com espessura de 8mm nos Banheiros, Cozinha, Plenária, Sala de Reuniões, Depósito, Estúdio.

- **Instalações Hidrossanitárias:**

Foram realizados na sua totalidade:

1. Instalação das divisórias em granito (cinza andorinha) devidamente fixado utilizando sistema de pinagem e massa plástica, no I.S. Feminino, e I.S. Masculino
2. Instalação das bancadas de granito (cinza polido) com cuba de embutir de louça, no I.S. Feminino, e I.S. Masculino
3. Instalações dos vasos sanitários com caixas acopladas, no I.S. Feminino, e I.S. Masculino e I.S. Especial; e, mictórios sifonados no I.S. Masculino
4. Instalação do Lavatório de louça (branca) com coluna, no I.S. Especial
5. Instalação da bancada de granito (cinza polido) para pia de cozinha e cuba de embutir de aço inoxidável, na cozinha
6. Instalação das bancadas de apoio em granito (cinza polido), na cozinha

O item sublinhado não está constando na planilha orçamentária.



PAVAN & BARROS
engenharia

• **Revestimento de Parede:**

Realização de mureta para bancada de apoio com alvenaria de blocos furados, chapisco, emboço e revestimento cerâmico, na cozinha

Execução de parede em alvenaria de blocos furados, chapisco e emboço para suporte do ar condicionado

Forro:

Foi instalado na sua totalidade os forros em placas pré-moldadas de gesso liso, no I.S. Feminino, I.S. Masculino e I.S. Especial.

O item sublinhado não está constando na planilha orçamentária.

• **Revestimento de Pisos:**

Foram realizados na sua totalidade:

- 1) Remoção do piso em taco de madeira no Gabinete Presidencial e contrapiso em argamassa, na Sala de Protocolo, Circulação e em parte faltante do Hall de Entrada.
- 2) Instalação das soleiras de granito (cinza andorinha), nos Estúdio, Depósito, Mezanino, Banheiros e Cozinha
- 3) Colocação do revestimento em pisos e rodapés cerâmicos tipo porcelanato, no Estúdio, Depósito, Circulações, Mezanino, Escadas, Banheiros, Cozinha, Hall de Entrada e Sala de Protocolo.



PAVAN & BARROS
engenharia

Obs.: Os revestimentos de pisos e rodapés descritos acima, foram substituídos por revestimentos de melhor qualidade, sendo que a escolha do novo revestimento foi definida pela comissão de licitação da Câmara de Vereadores, e seu item será suprimido e substituído no aditivo.

Salientando que deixou de constar no relatório anterior referente a setembro/2017 a realização do contrapiso em argamassa, no depósito, mezanino, escada, circulações, banheiros, cozinha e parte hall de entrada.

• **Estrutura Metálica para o Mezanino:**

Foi realizada a instalação na sua totalidade a ampliação do mezanino e guarda corpo de estruturas metálicas.

Obs.: Pôr não existir projeto da referida estrutura, a empreiteira seguiu o dimensionamento estabelecido no item da planilha orçamentária, conforme comunicado verbal feito junto ao representante da comissão de licitação.

A medida constante na planilha licitada, referente a instalação do mezanino, não foi suficiente para atender as necessidades da ampliação, sendo que, o acréscimo da área será incluso no referido aditivo.

• **Pintura:**

Foi realizada na sua totalidade a pintura da cobertura metálica em duas demãos, com tinta própria para proteção da superfície contra corrosão.



PAVAN & BARROS
engenharia

Os Itens sublinhados, não constantes na planilha orçamentária, contidos no relatório do mês anterior (setembro/2017) e no presente, serão adicionados no aditivo.

Na execução dos serviços foram observados todos os procedimentos constantes no memorial descritivo, conforme imagens anexas.


ANEXO




Caçamba para remoção de resíduos




Requadro de vão com utilização de andaime




PAVAN & BARROS
engenharia

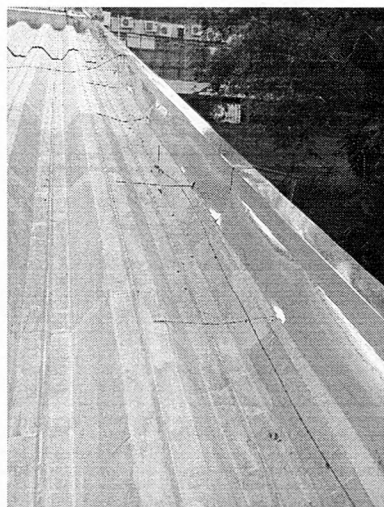


Instalação de rufo em chapa galvanizada

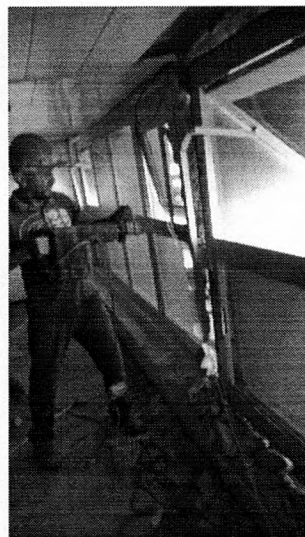

Retirada de esquadrias metálicas

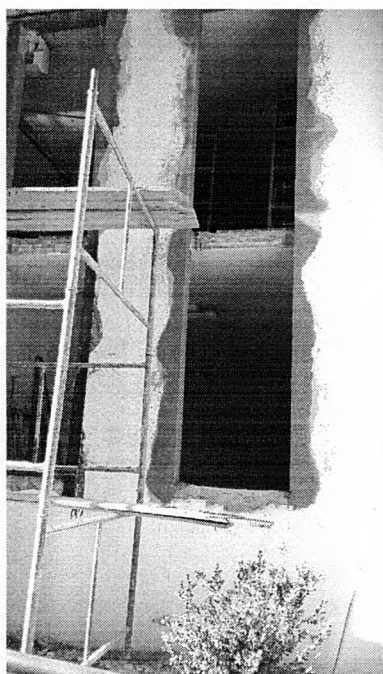


Requadro de vãos

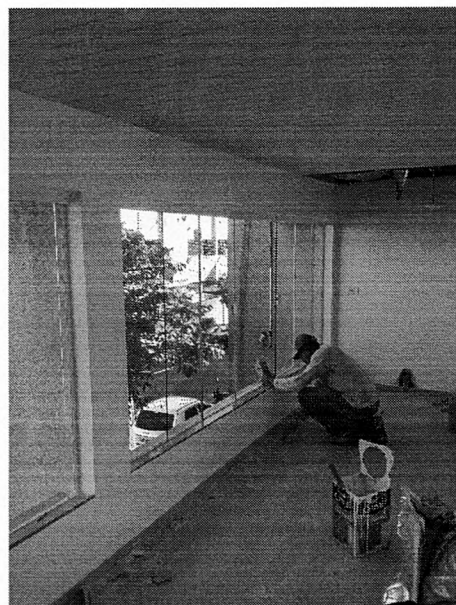


Vidros temperados instalados

43-3162 2151

Av. Curitiba, 831 sala 12 - 1º andar
Centro Empresarial Joaquim D. Pacheco
CEP: 86.800-005 - Apucarana - PR



PAVAN & BARROS
engenharia

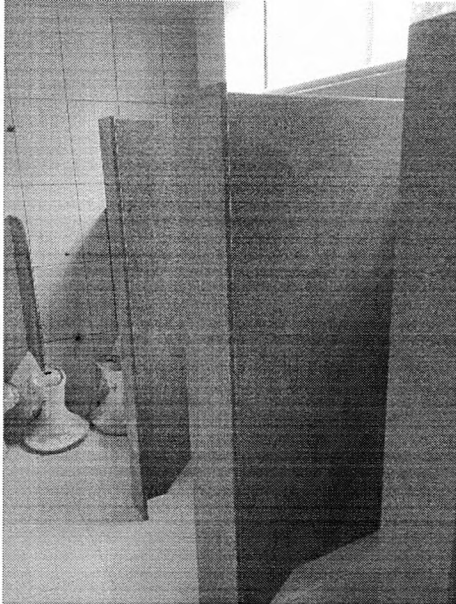

Divisória em granito instalada



Instalação dos vasos sanitários




Bancada de granito com cuba embutida



Instalação dos mictórios




PAVAN & BARROS
engenharia

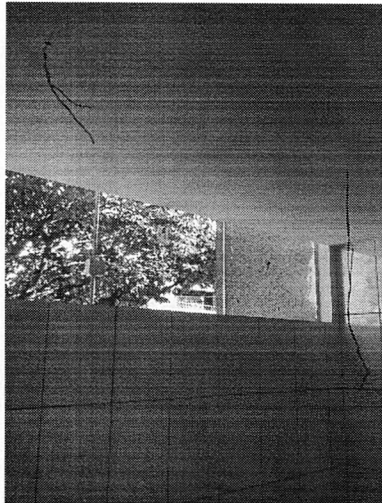

Forro de gesso instalado



Contrapiso de argamassa

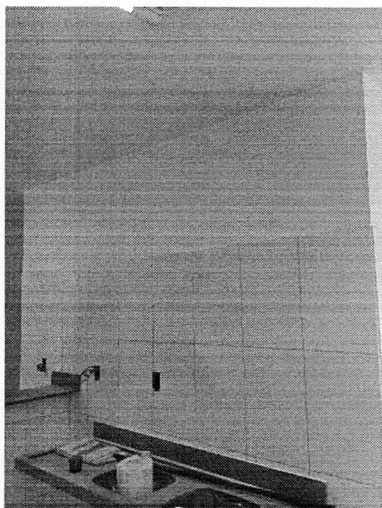

Bancada de granito com cuba para cozinha



Instalação do piso cerâmico
